

Anomalías empañan megaobra queretana

Centro de convenciones costó 624 mdp y debía abrir en 2009

Juan José Arreola Corresponsal

QUERÉTARO

Una serie de retrasos y la aportación de más recursos ensombrecen la anunciada inauguración del Centro de Congresos y Convenciones de Querétaro.

En junio de 2008, cuando se inició su construcción, el plazo para concluirlo era de 13 meses, con una inversión de 400 millones de pesos. Sin embargo, debido a una veintena de irregularidades técnicas y financieras, además de deficiencias en su planeación, la obra enfrentó imprevistos.

Incluso, tuvo un gasto 56% mayor a lo presupuestado y se tardó en concluir 18 meses más de lo planeado.

El 5 de febrero, el Centro de Convenciones de Querétaro (CCQ) —como finalmente quedó nombrado— será inaugurado por el presidente Felipe Calderón, sin que hasta el momento se haya sancionado a los funcionarios responsables de las irregularidades.

Para lograr que estuviera lista la obra fue menester incremen-

tar el gasto público, al pasar de 400 a 624 millones 396 mil 831 pesos con 21 centavos, confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Sergio Chufani.

Las anomalías, reportó en octubre pasado la Entidad Superior de Fiscalización (ESF) en un informe entregado a la 56 Legislatura local, se debieron “a que no se contó con los proyectos de ingeniería necesarios en la etapa de planeación y previo a la ejecución de las obras, como se establece en la legislación aplicable, aun cuando se pagó la realización y dirección de un proyecto, ya que éste no contó con las definiciones necesarias para ejecutarlo”.

La ESF agrupó las inconsistencias en la falta de cobertura en los requerimientos pactados (sin acabados en pisos y muros); contratos finiquitados sin su total cumplimiento y ocho obras sin terminar y suspendidas hasta septiembre de 2009.

Generará mil millones

El CCQ forma parte de un complejo denominado temporalmente Ciudad de la Cultura y las Artes, que incluye al lla-

mado Palacio de las Artes y que en conjunto ha requerido, hasta el momento, una inversión que asciende a los mil 344 millones de pesos.

Este CCQ se asienta sobre una superficie de 8 mil 920 metros cuadrados y cuenta con planta alta, planta baja y dos entresijos. En el nivel superior se ubican salones para banquetes y congresos, además de una terraza y una cocina.

En el segundo entresijo se ubican oficinas administrativas del centro y un cuarto de máquinas, mientras que en el primer entresijo funcionará el centro de negocios, el área de comercios y una cafetería. Además de la recepción general, en la plan-


ta baja se encuentran dos zonas para exposiciones, una abierta con capacidad para 120 stands, mientras que la otra —techada— tiene cupo para 380 puestos de exhibición. También en la planta baja hay tres salones y un vestíbulo.

El gobierno estatal estima que a partir del 5 de febrero se realicen 30 actividades durante el año, a las que acudirán unos 71 mil congresistas que generarán una derrama mayor a mil millones de pesos.



Fecha 31.01.2011	Sección Metrópolis	Página 8
----------------------------	------------------------------	--------------------

Los festejos
por el inicio del
CCQ durarán
18 días; habrá
exposiciones,
conferencias,
talleres, con-
ciertos y even-
tos de danza

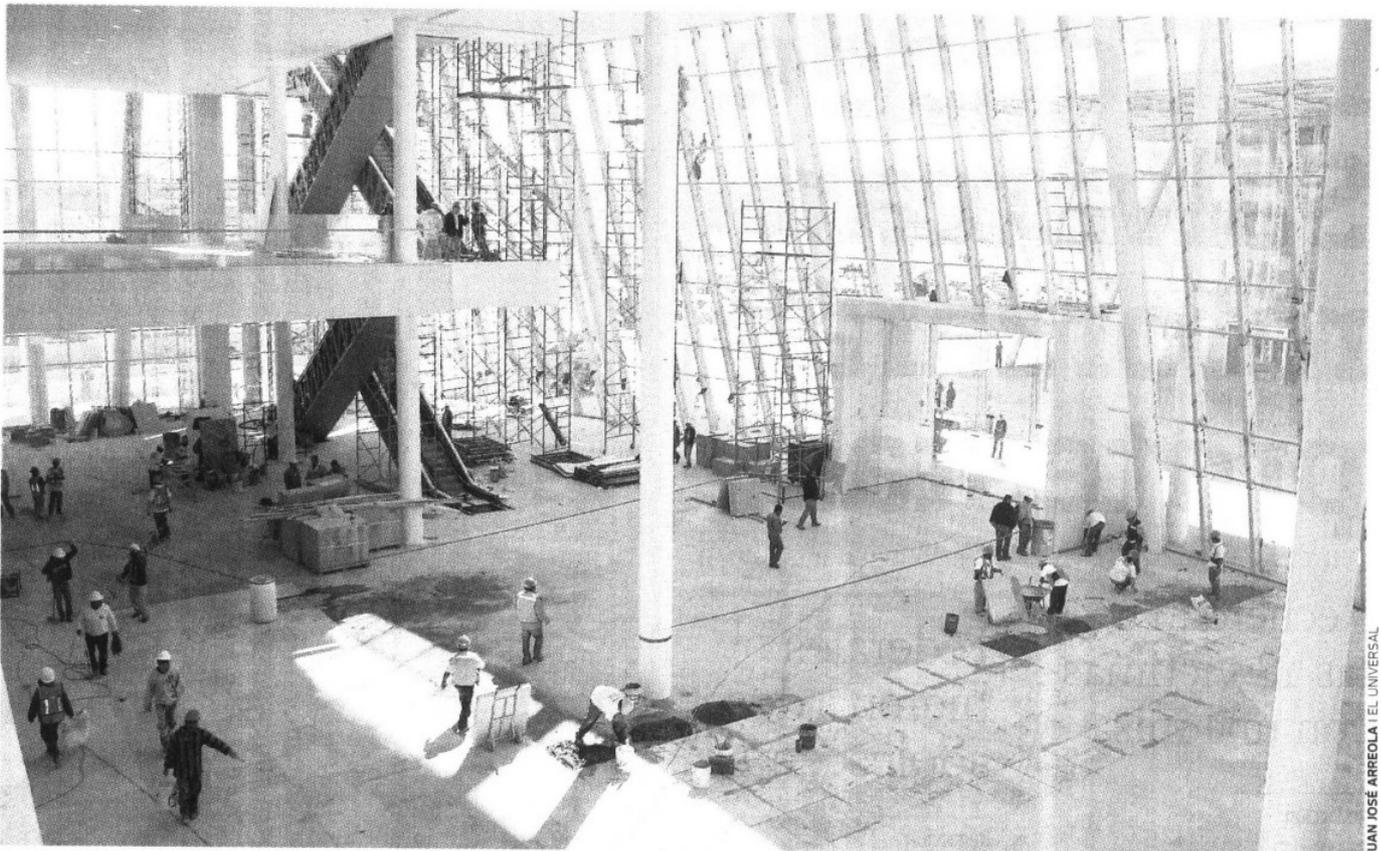

JUAN JOSÉ ARREOLA / EL UNIVERSAL

ACELERAN. El 5 de febrero, el Centro de Convenciones de Querétaro (CCQ) será inaugurado por el presidente Felipe Calderón
